






Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	27 sep '26 27/09	04 oct '26 04/10	11 oct '26 11/10	18
1		Inicio	32 días	jue 08/10/26	vie 20/11/26					
2		Inicio del proyecto	0 días	jue 08/10/26	jue 08/10/26					
3		Elaboración del Gantt inicial	3 días	jue 08/10/26	lun 12/10/26					
4		Reunión y revisión del alcance	5 días	mar 13/10/26	lun 19/10/26	3				
5		Toma y validación de requerimientos	10 días	mar 20/10/26	lun 02/11/26	4				
6		Documentación del caso de uso principal	4 días	mar 03/11/26	vie 06/11/26	5				
7		Documentación de CU-01 a CU-05	10 días	lun 09/11/26	vie 20/11/26	6				
8		Planeación	98 días	lun 23/11/26	mié 07/04/27					
9		Cálculo de esfuerzo, tiempo y costo	4 días	lun 23/11/26	jue 26/11/26	7				
10		Elaboración de la propuesta	6 días	vie 27/11/26	vie 04/12/26	9				
11		Entrega de la propuesta	0 días	vie 04/12/26	vie 04/12/26	10				
12		Elaboración del acta del proyecto	4 días	lun 07/12/26	jue 10/12/26	11				
13		Aprobación del acta del proyecto	0 días	jue 10/12/26	jue 10/12/26					
14		Planeación Desarrollo	84 días	vie 11/12/26	mié 07/04/27					
15		Arquitectura MVC y modelo de datos	24 días	vie 11/12/26	mié 13/01/27	13				
16		Diseño de interfaces de CU-01 a CU-05	28 días	jue 14/01/27	lun 22/02/27	15				
17		Diseño técnico y reglas de negocio en C#	24 días	mar 23/02/27	vie 26/03/27	16				
18		Plan de pruebas y revisión de riesgos	8 días	lun 29/03/27	mié 07/04/27	17				
19		Ejecución	161 días	jue 08/04/27	jue 18/11/27					
20		Entorno, base del sistema y accesos	12 días	jue 08/04/27	vie 23/04/27	18				
21		CU-05: profesores y configuración	25 días	lun 26/04/27	vie 28/05/27					
22		Análisis	4 días	lun 26/04/27	jue 29/04/27	20				
23		Diseño	5 días	vie 30/04/27	jue 06/05/27	22				



Project: GanttEjercicio01.mpp Date: vie 09/10/26	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
	Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
	Inactive Task		Start-only			
	Inactive Milestone		Finish-only			

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	27 sep '26 27/09	04 oct '26 04/10	11 oct '26 11/10	18
24	→	Programación	12 días	vie 07/05/27	lun 24/05/27	23				
25	→	Pruebas	4 días	mar 25/05/27	vie 28/05/27	24				
26	→	Liberación del caso de uso	0 días	vie 28/05/27	vie 28/05/27	25				
27	→	CU-01: inscripción, descuento y cobro	25 días	lun 31/05/27	vie 02/07/27					
28	→	Análisis	4 días	lun 31/05/27	jue 03/06/27	26				
29	→	Diseño	5 días	vie 04/06/27	jue 10/06/27	28				
30	→	Programación	12 días	vie 11/06/27	lun 28/06/27	29				
31	→	Pruebas	4 días	mar 29/06/27	vie 02/07/27	30				
32	→	Liberación del caso de uso	0 días	vie 02/07/27	vie 02/07/27	31				
33	→	CU-02: agenda, disponibilidad y avisos	30 días	lun 05/07/27	vie 13/08/27					
34	→	Análisis	5 días	lun 05/07/27	vie 09/07/27	32				
35	→	Diseño	6 días	lun 12/07/27	lun 19/07/27	34				
36	→	Programación	15 días	mar 20/07/27	lun 09/08/27	35				
37	→	Pruebas	4 días	mar 10/08/27	vie 13/08/27	36				
38	→	Liberación del caso de uso	0 días	vie 13/08/27	vie 13/08/27	37				
39	→	CU-03: exámenes, calificación e historial	25 días	lun 16/08/27	vie 17/09/27					
40	→	Análisis	4 días	lun 16/08/27	jue 19/08/27	38				
41	→	Diseño	5 días	vie 20/08/27	jue 26/08/27	40				
42	→	Programación	12 días	vie 27/08/27	lun 13/09/27	41				
43	→	Pruebas	4 días	mar 14/09/27	vie 17/09/27	42				
44	→	Liberación del caso de uso	0 días	vie 17/09/27	vie 17/09/27	43				
45	→	CU-04: asistencia móvil y códigos de barras	25 días	lun 20/09/27	vie 22/10/27					
46	→	Análisis	4 días	lun 20/09/27	jue 23/09/27	44				


Project: GanttEjercicio01.mpp Date: vie 09/10/26	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
	Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
	Inactive Task		Start-only			
	Inactive Milestone		Finish-only			

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	27 sep '26 27/09	04 oct '26 04/10	11 oct '26 11/10	18
47	→	Diseño	5 días	vie 24/09/27	jue 30/09/27	46				
48	→	Programación	12 días	vie 01/10/27	lun 18/10/27	47				
49	→	Pruebas	4 días	mar 19/10/27	vie 22/10/27	48				
50	→	Liberación del caso de uso	0 días	vie 22/10/27	vie 22/10/27	49				
51	→	CU-05: turnos, asistencia y pagos del personal	19 días	lun 25/10/27	jue 18/11/27					
52	→	Análisis	2 días	lun 25/10/27	mar 26/10/27	50				
53	→	Diseño	3 días	mié 27/10/27	vie 29/10/27	52				
54	→	Programación	7 días	lun 01/11/27	mar 09/11/27	53				
55	→	Pruebas	2 días	mié 10/11/27	jue 11/11/27	54				
56	→	Liberación del caso de uso	0 días	jue 11/11/27	jue 11/11/27	55				
57	→	Integración y pruebas del sistema	5 días	vie 12/11/27	jue 18/11/27	56				
58	→	Liberación para aceptación	0 días	jue 18/11/27	jue 18/11/27	57				
59	📌	Seguimiento y control	324 días	jue 08/10/26	mar 04/01/28					
60	📌	Seguimiento de avances, riesgos y costos	324 días	jue 08/10/26	mar 04/01/28	2				
61	→	Revisión de la entrega de desarrollo	0 días	jue 18/11/27	jue 18/11/27	33				
62	→	Cierre	33 días	vie 19/11/27	mar 04/01/28					
63	→	Pruebas de aceptación con usuarios	18 días	vie 19/11/27	mar 14/12/27	58				
64	→	Corrección de incidencias finales	10 días	vie 10/12/27	jue 23/12/27					
65	→	Despliegue y entrega del sistema	8 días	vie 24/12/27	mar 04/01/28	64				
66	→	Acta de entrega y cierre del proyecto	0 días	mar 04/01/28	mar 04/01/28	65				



Project: GanttEjercicio01.mpp Date: vie 09/10/26	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
	Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
	Inactive Task		Start-only			
	Inactive Milestone		Finish-only			

18 oct '26 18/10	25 oct '26 25/10	01 nov '26 01/11	08 nov '26 08/11	15 nov '26 15/11	22 nov '26 22/11	29 nov '26 29/11	06 dic '26 06/12	13 dic '26 13/12	20 dic '26 20/12	27 dic '26 27/12	03 ene '27 03/01	10 ene '27 10/01	17 ene '27 17/01	24 ene '27 24/01
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

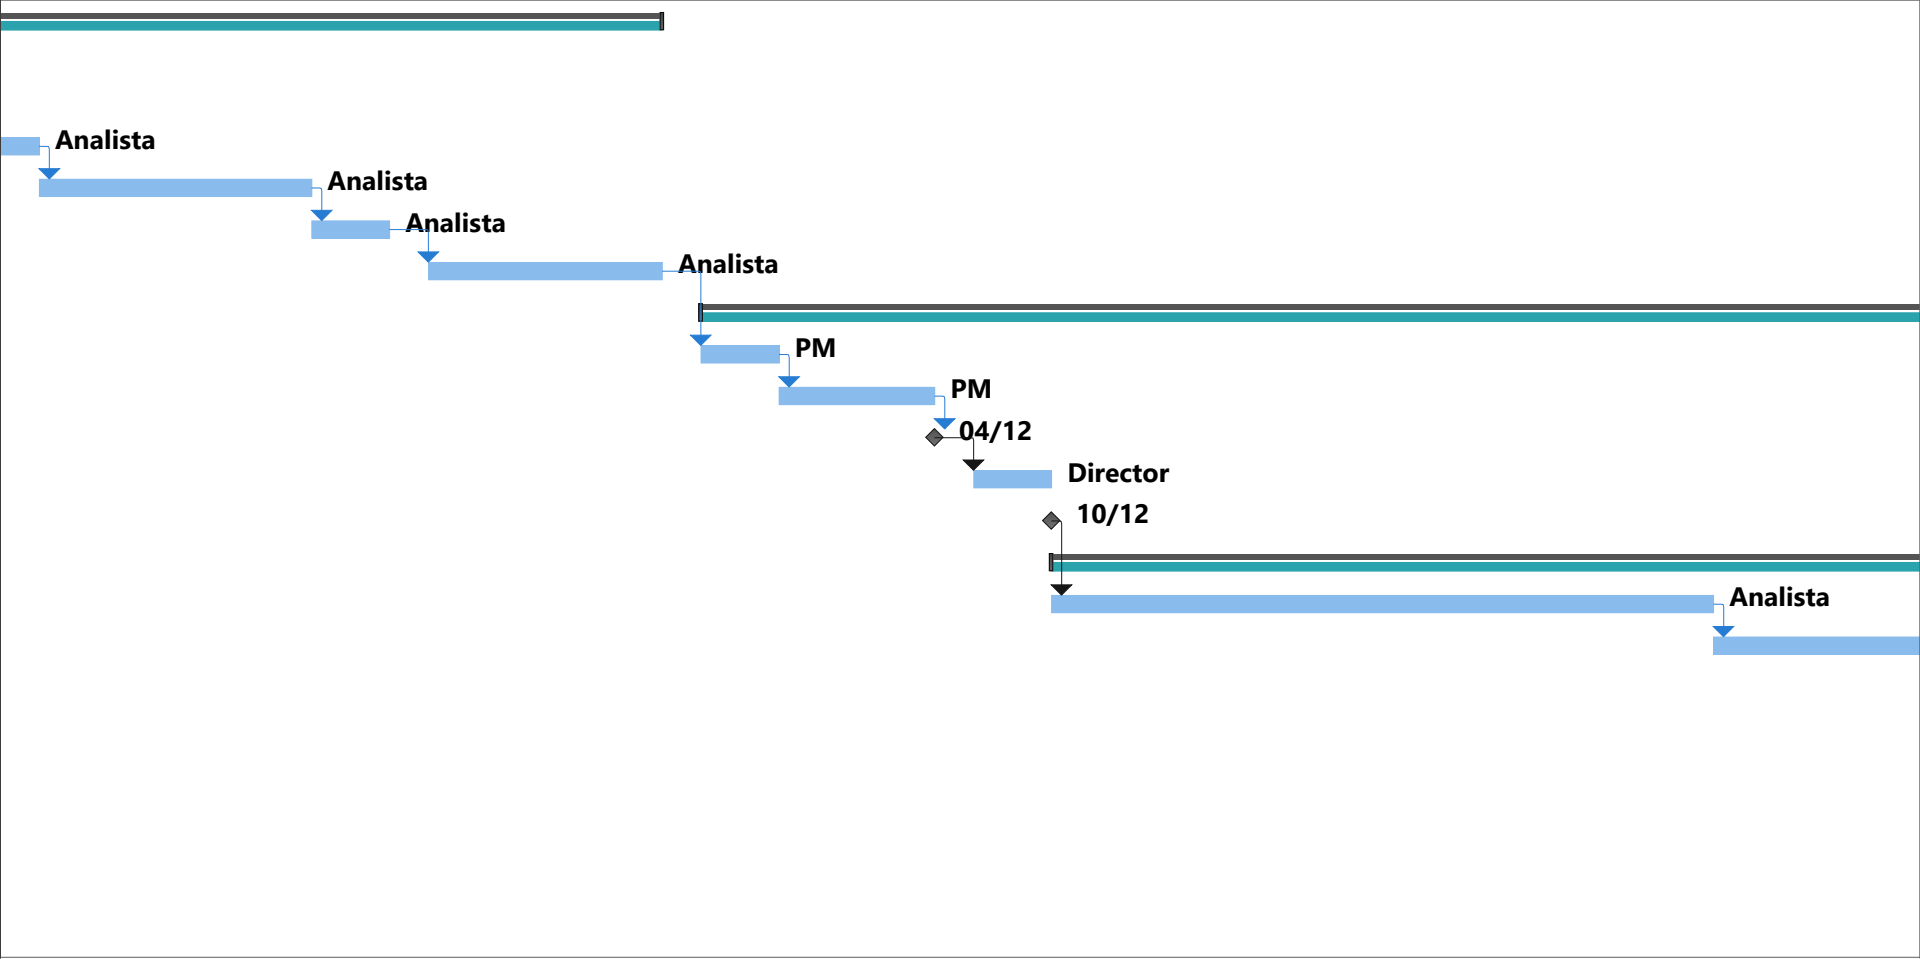


Project: GanttEjercicio01.mpp Date: vie 09/10/26	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
	Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
	Inactive Task		Start-only			
	Inactive Milestone		Finish-only			

18 oct '26 18/10	25 oct '26 25/10	01 nov '26 01/11	08 nov '26 08/11	15 nov '26 15/11	22 nov '26 22/11	29 nov '26 29/11	06 dic '26 06/12	13 dic '26 13/12	20 dic '26 20/12	27 dic '26 27/12	03 ene '27 03/01	10 ene '27 10/01	17 ene '27 17/01	24 ene '27 24/01
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------




Project: GanttEjercicio01.mpp Date: vie 09/10/26	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
	Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
	Inactive Task		Start-only			
	Inactive Milestone		Finish-only			

18 oct '26 18/10	25 oct '26 25/10	01 nov '26 01/11	08 nov '26 08/11	15 nov '26 15/11	22 nov '26 22/11	29 nov '26 29/11	06 dic '26 06/12	13 dic '26 13/12	20 dic '26 20/12	27 dic '26 27/12	03 ene '27 03/01	10 ene '27 10/01	17 ene '27 17/01	24 ene '27 24/01
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------



Project: GanttEjercicio01.mpp Date: vie 09/10/26	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
	Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
	Inactive Task		Start-only			
	Inactive Milestone		Finish-only			

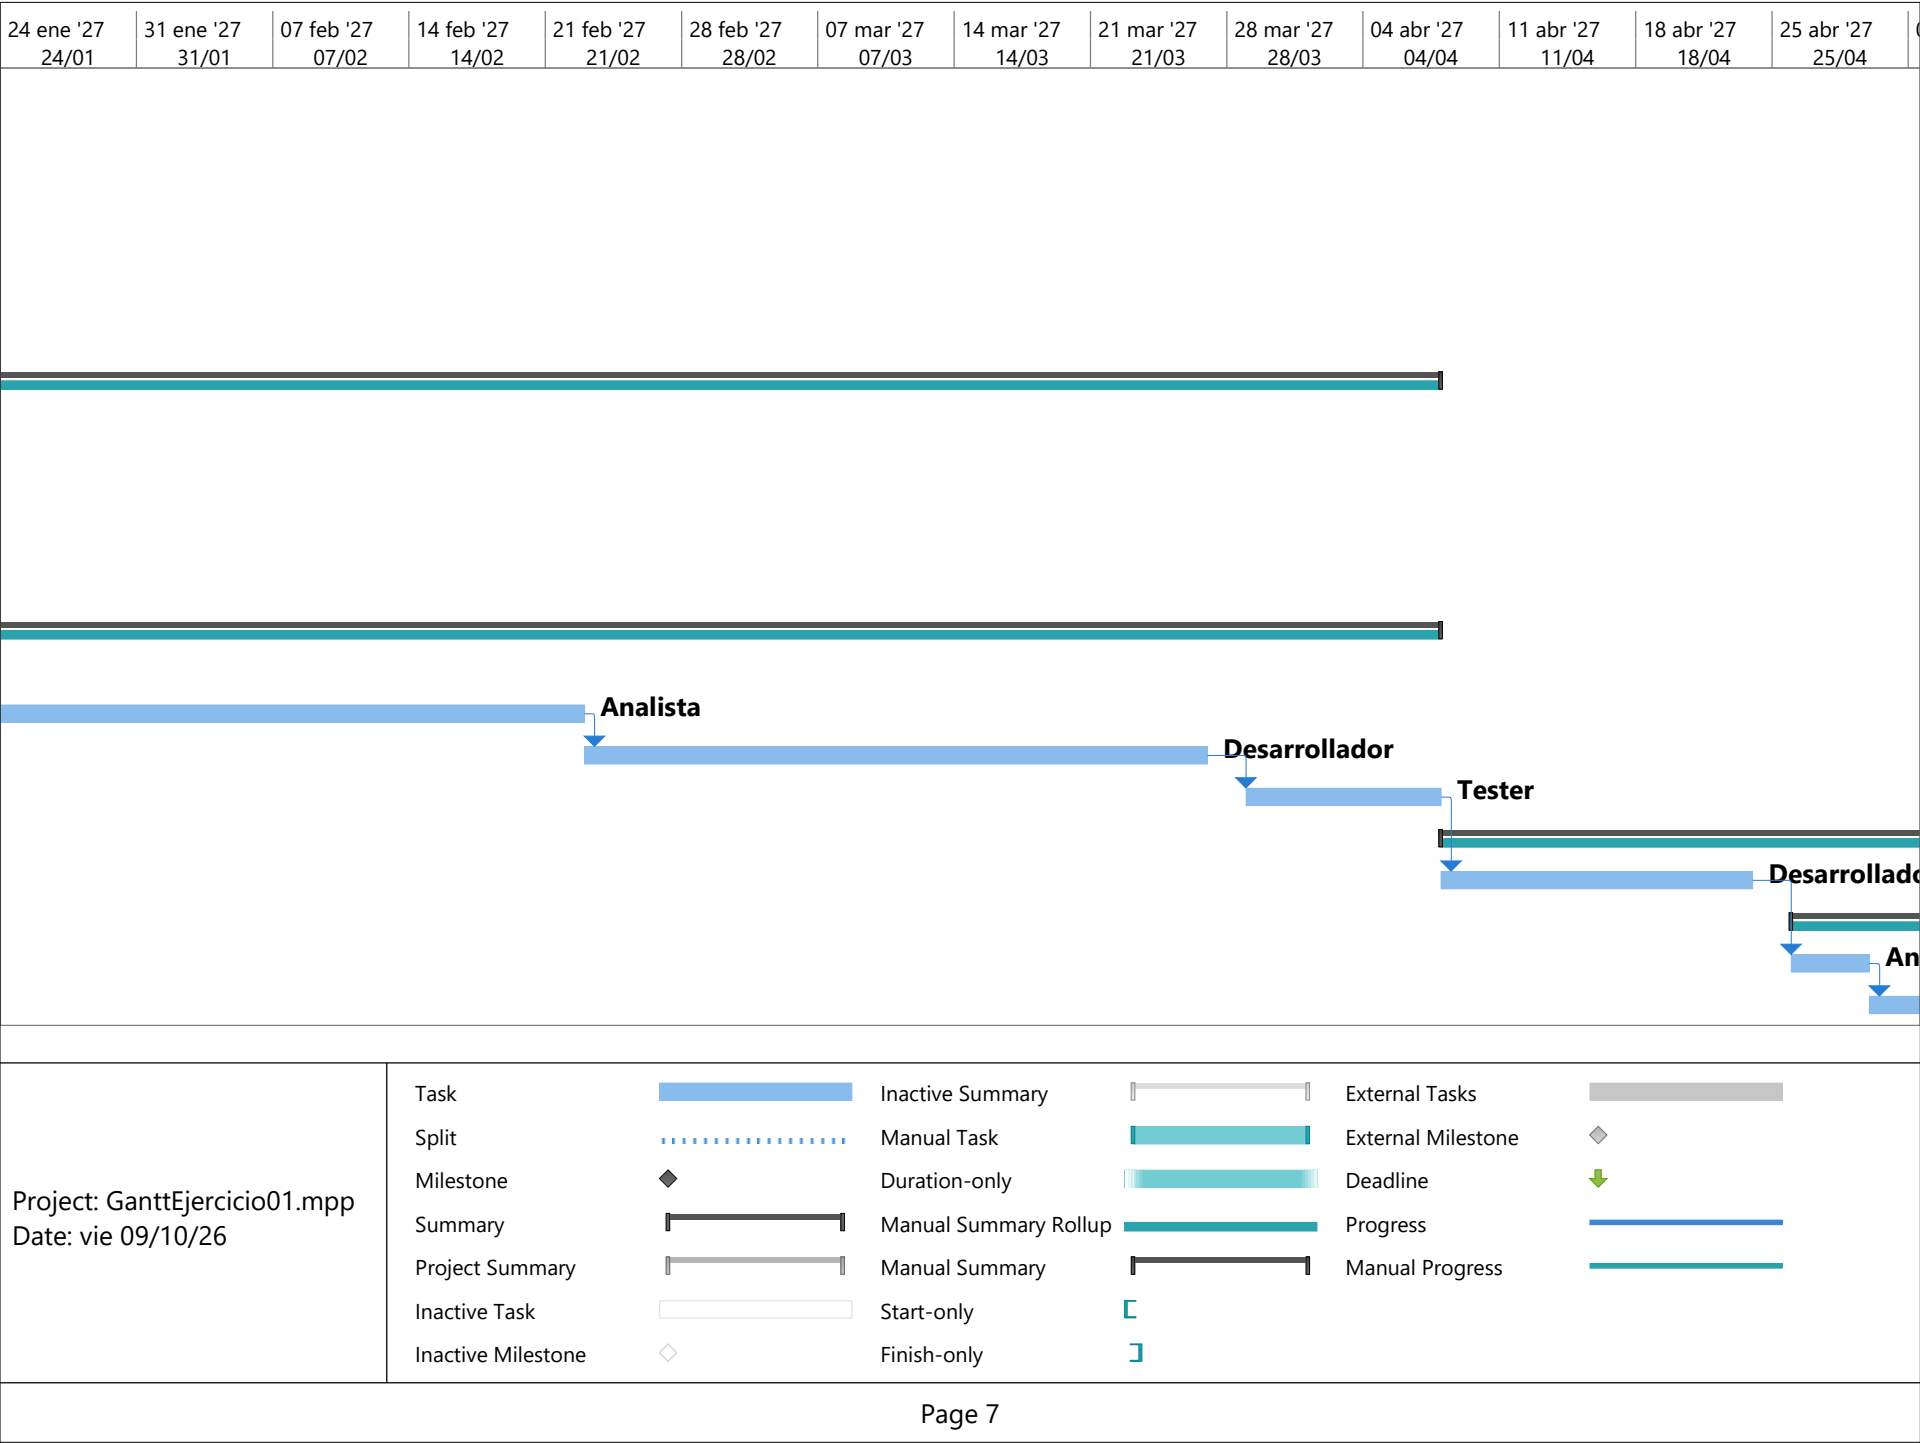



24 ene '27 24/01	31 ene '27 31/01	07 feb '27 07/02	14 feb '27 14/02	21 feb '27 21/02	28 feb '27 28/02	07 mar '27 07/03	14 mar '27 14/03	21 mar '27 21/03	28 mar '27 28/03	04 abr '27 04/04	11 abr '27 11/04	18 abr '27 18/04	25 abr '27 25/04	
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--



Project: GanttEjercicio01.mpp Date: vie 09/10/26	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
	Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
	Inactive Task		Start-only			
	Inactive Milestone		Finish-only			

24 ene '27 24/01	31 ene '27 31/01	07 feb '27 07/02	14 feb '27 14/02	21 feb '27 21/02	28 feb '27 28/02	07 mar '27 07/03	14 mar '27 14/03	21 mar '27 21/03	28 mar '27 28/03	04 abr '27 04/04	11 abr '27 11/04	18 abr '27 18/04	25 abr '27 25/04	
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--



Project: GanttEjercicio01.mpp Date: vie 09/10/26	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
	Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
	Inactive Task		Start-only			
	Inactive Milestone		Finish-only			

02 may '27 02/05	09 may '27 09/05	16 may '27 16/05	23 may '27 23/05	30 may '27 30/05	06 jun '27 06/06	13 jun '27 13/06	20 jun '27 20/06	27 jun '27 27/06	04 jul '27 04/07	11 jul '27 11/07	18 jul '27 18/07	25 jul '27 25/07	01 ago '27 01/08	
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--



dor




Analista

Analista


Project: GanttEjercicio01.mpp Date: vie 09/10/26	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
	Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
	Inactive Task		Start-only			
	Inactive Milestone		Finish-only			

02 may '27 02/05	09 may '27 09/05	16 may '27 16/05	23 may '27 23/05	30 may '27 30/05	06 jun '27 06/06	13 jun '27 13/06	20 jun '27 20/06	27 jun '27 27/06	04 jul '27 04/07	11 jul '27 11/07	18 jul '27 18/07	25 jul '27 25/07	01 ago '27 01/08	
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

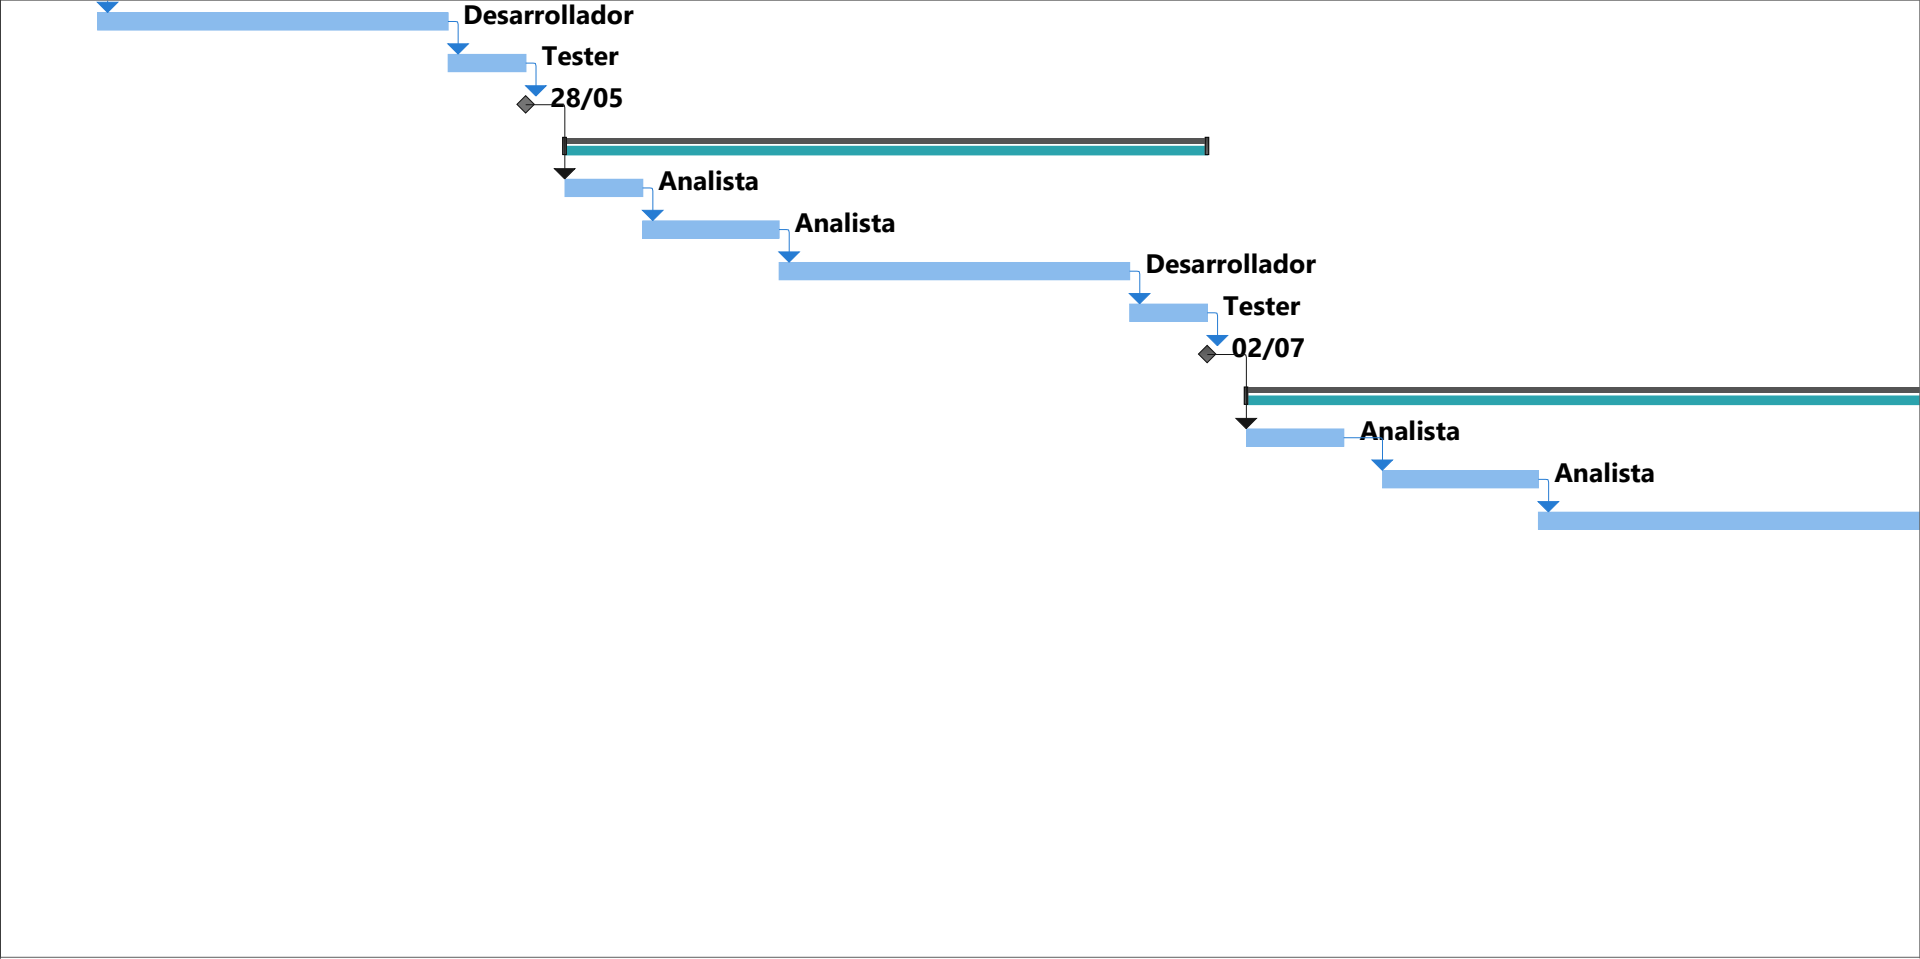


Project: GanttEjercicio01.mpp Date: vie 09/10/26	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
	Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
	Inactive Task		Start-only			
	Inactive Milestone		Finish-only			

08 ago '27 08/08	15 ago '27 15/08	22 ago '27 22/08	29 ago '27 29/08	05 sep '27 05/09	12 sep '27 12/09	19 sep '27 19/09	26 sep '27 26/09	03 oct '27 03/10	10 oct '27 10/10	17 oct '27 17/10	24 oct '27 24/10	31 oct '27 31/10	07 nov '27 07/11	
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--




Project: GanttEjercicio01.mpp Date: vie 09/10/26	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
	Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
	Inactive Task		Start-only			
	Inactive Milestone		Finish-only			


08 ago '27 08/08	15 ago '27 15/08	22 ago '27 22/08	29 ago '27 29/08	05 sep '27 05/09	12 sep '27 12/09	19 sep '27 19/09	26 sep '27 26/09	03 oct '27 03/10	10 oct '27 10/10	17 oct '27 17/10	24 oct '27 24/10	31 oct '27 31/10	07 nov '27 07/11
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

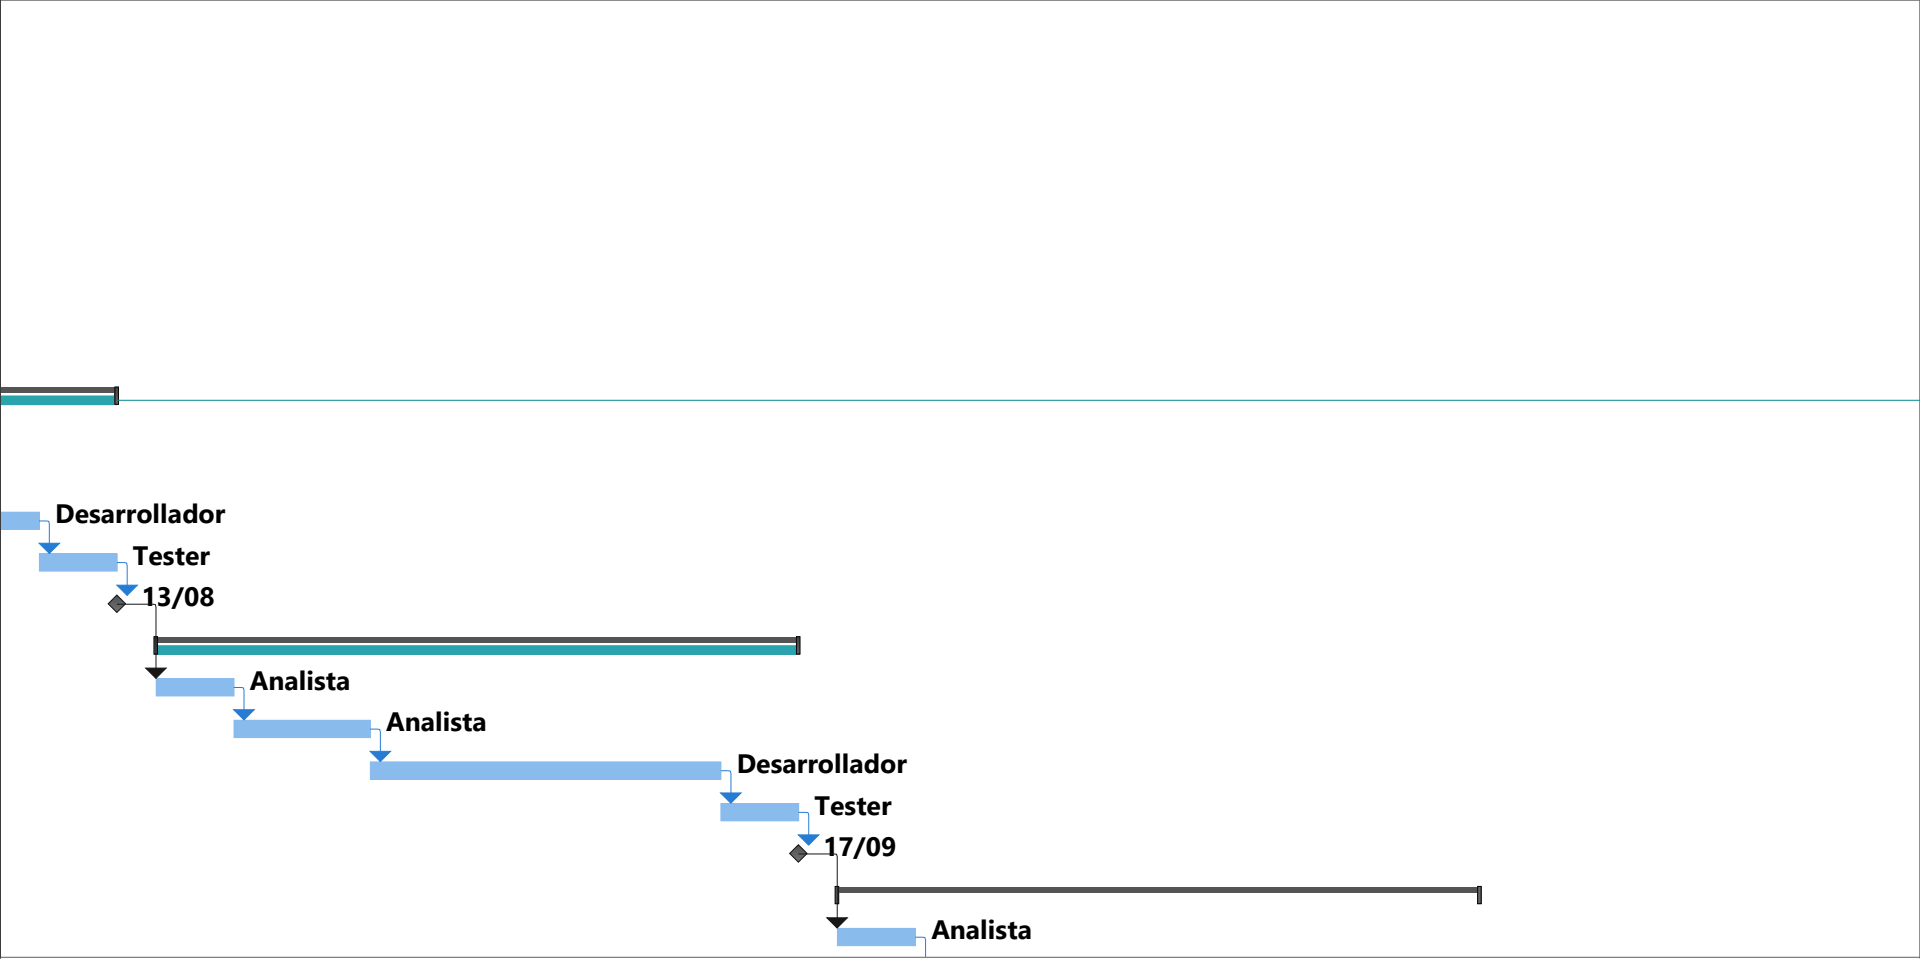

Project: GanttEjercicio01.mpp Date: vie 09/10/26	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
	Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
	Inactive Task		Start-only			
	Inactive Milestone		Finish-only			

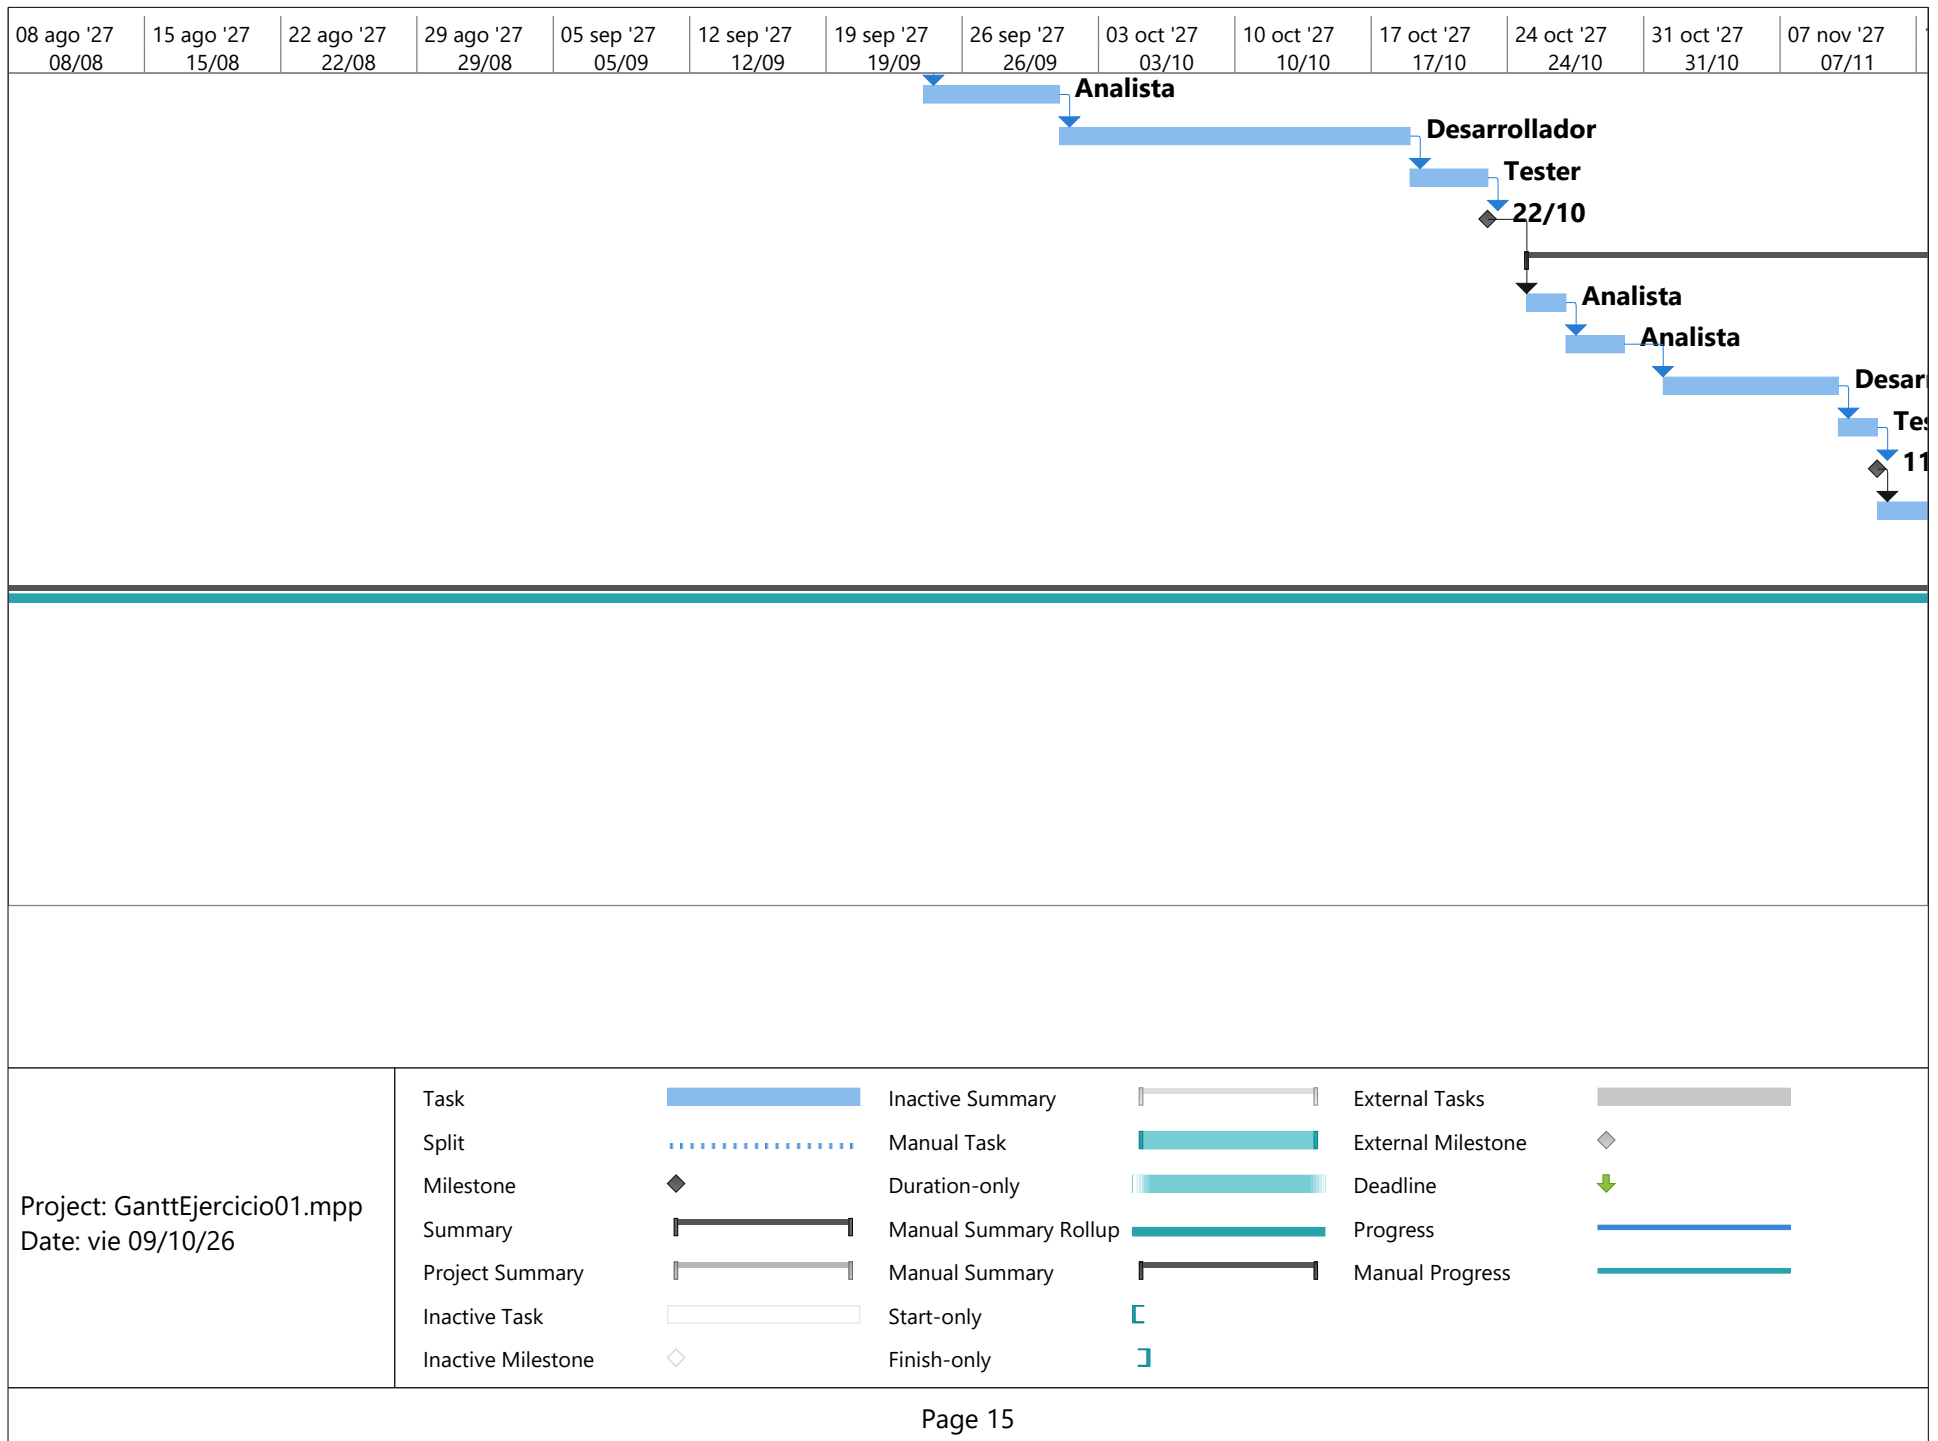


14 nov '27 14/11	21 nov '27 21/11	28 nov '27 28/11	05 dic '27 05/12	12 dic '27 12/12	19 dic '27 19/12	26 dic '27 26/12	02 ene '28 02/01	09 ene '28 09/01	16 ene '28 16/01	23 ene '28 23/01	30 ene '28 30/01	06 feb '28 06/02	13 feb '28 13/02	20 feb '28 20/02
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------



Project: GanttEjercicio01.mpp Date: vie 09/10/26	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
	Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
	Inactive Task		Start-only			
	Inactive Milestone		Finish-only			

14 nov '27 14/11	21 nov '27 21/11	28 nov '27 28/11	05 dic '27 05/12	12 dic '27 12/12	19 dic '27 19/12	26 dic '27 26/12	02 ene '28 02/01	09 ene '28 09/01	16 ene '28 16/01	23 ene '28 23/01	30 ene '28 30/01	06 feb '28 06/02	13 feb '28 13/02	20 feb '28 20/02
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------



Project: GanttEjercicio01.mpp Date: vie 09/10/26	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
	Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
	Inactive Task		Start-only			
	Inactive Milestone		Finish-only			

